Trabajo Práctico Integrador N°2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Matías Salazar.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Franco Cortés Romero

26 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

- Consigna 1 - Análisis FODA 4
- Consigna 2 - Objetivos y metas 5
- Consigna 3 - Planificación temporal (Gantt) 6
- Declaración de transparencia en el uso de IA 7

Conclusión 7

Referencias 8

Trabajo Práctico Integrador N°2

Introducción

En la Entrega N°1 de este Trabajo Práctico Integrador se presentó el diagnóstico sistémico de Óptica Central, una cadena de ópticas de la provincia, identificando como problema puntual la falta de sincronización entre el stock de la tienda online (Tiendanube) y el stock real de las sucursales, gestionado en el sistema Moebius. A partir de ese diagnóstico, en esta segunda entrega se avanza sobre la planeación del proyecto tecnológico propuesto para resolver ese problema: un módulo de sincronización de stock que conecte Moebius con la tienda online a través de la API que Tiendanube ya ofrece. Para eso se desarrolla a continuación un análisis FODA del proyecto, se definen sus objetivos y metas, y se plantea una planificación temporal de las tareas necesarias para llevarlo adelante.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Analizar la viabilidad del proyecto de software propuesto a partir de un análisis FODA.
- Definir un objetivo general y metas cuantitativas claras para el proyecto.
- Planificar en el tiempo las tareas necesarias para desarrollar el proyecto, estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Consigna

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto, clasificando las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico frente a las Oportunidades y Amenazas del entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto y al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas críticas para la construcción del software, estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1 - Análisis FODA

Se presenta a continuación el análisis FODA del proyecto de sincronización de stock, distinguiendo los factores internos (que dependen del equipo técnico) de los externos (que dependen del entorno de la empresa).

Fortalezas: uso diario de Moebius desde el soporte, lo que permite conocer bien su comportamiento y sus fallas; la solución se apoya en una API que Tiendanube ya ofrece, por lo que no hay que construir la integración desde cero; el desarrollo se hace en conjunto con el equipo de Moebius, a diferencia del intento anterior, que dependía por completo de un proveedor externo.

Debilidades: integrar Moebius con Tiendanube requiere modificar la base de datos de Moebius; conversando con su equipo, confirmaron que es posible pero no sencillo, y que preferentemente lo tienen que hacer ellos mismos, guiados por el área de Sistemas; al depender en parte del equipo de Moebius para esos cambios, el ritmo de avance del proyecto no está completamente bajo control propio.

Oportunidades: la API de Tiendanube ya está pensada para este uso, lo que reduce el trabajo técnico; el problema ya generó una pérdida real (una venta de $300.000 que no se encontraba en el momento de la entrega), lo que le da urgencia y respaldo del dueño; no hay otro proyecto interno compitiendo por resolver este mismo problema.

Amenazas: que la API de Tiendanube tenga límites técnicos que compliquen la sincronización en tiempo real; que el dueño cambie de prioridades, como ya ocurrió con el intento anterior de integración; que un error de sincronización derive en vender algo sin stock real, dañando la confianza del cliente.

Matriz FODA del proyecto

INTERNO

FORTALEZAS

- Uso diario de Moebius desde el soporte: se conoce bien su comportamiento y sus fallas.
- La solución se apoya en una API que Tiendanube ya ofrece, no hay que construirla desde cero.
- El desarrollo se hace en conjunto con el equipo de Moebius, a diferencia del intento anterior que dependía por completo de un proveedor externo.

DEBILIDADES

- Integrar Moebius con Tiendanube requiere modificar la base de datos de Moebius; es posible pero no sencillo, y preferentemente lo tiene que hacer su propio equipo, guiado por Sistemas.
- Al depender en parte del equipo de Moebius para los cambios de base de datos, el ritmo de avance no está completamente bajo control propio.

OPORTUNIDADES

- La API de Tiendanube ya está pensada para este uso, lo que reduce el trabajo técnico.
- El problema ya generó una pérdida real (venta de $300.000 no encontrada), lo que le da urgencia y respaldo del dueño.
- No hay otro proyecto interno compitiendo por resolver este mismo problema.

AMENAZAS

- Que la API de Tiendanube tenga límites técnicos que compliquen la sincronización en tiempo real.
- Que el dueño cambie de prioridades, como pasó con el intento anterior.
- Que un error de sincronización derive en vender algo sin stock real, dañando la confianza del cliente.

Consigna 2 - Objetivos y metas

Objetivo general: desarrollar un módulo de sincronización de stock que conecte el inventario de armazones de Moebius con el de la tienda online (Tiendanube) a través de la API que esta plataforma ya ofrece, para que ambas reflejen el mismo stock en tiempo real.

Metas cuantitativas:

1. Sincronizar el stock en menos de 1 minuto desde que se actualiza en cualquiera de las dos plataformas.


2. Cubrir el 100% de los modelos de armazones más vendidos en la primera etapa de implementación.

3. Reducir a cero las ventas online de productos sin stock físico disponible, dentro de los primeros 90 días de uso.

Consigna 3 - Planificación temporal (Gantt)

A continuación se detallan las tareas críticas del proyecto, con su duración estimada, la tarea de la que depende (precedencia) y las áreas responsables de cada una.

Tarea	Duración	Precedencia	Responsable
Relevamiento de la API de Tiendanube y la base de Moebius	1 semana	—	Área de Sistemas
Diseño de la arquitectura de sincronización	2 semanas	Relevamiento	Área de Sistemas
Desarrollo e integración (modificaciones en la base de Moebius y módulo de sincronización)	6 semanas	Diseño	Área de Sistemas y Equipo Moebius
Pruebas piloto con los armazones más vendidos	1 semana	Desarrollo	Área de Sistemas y Área de Armazones
Implementación y monitoreo	1 semana	Pruebas	Área de Sistemas y Área de Marketing

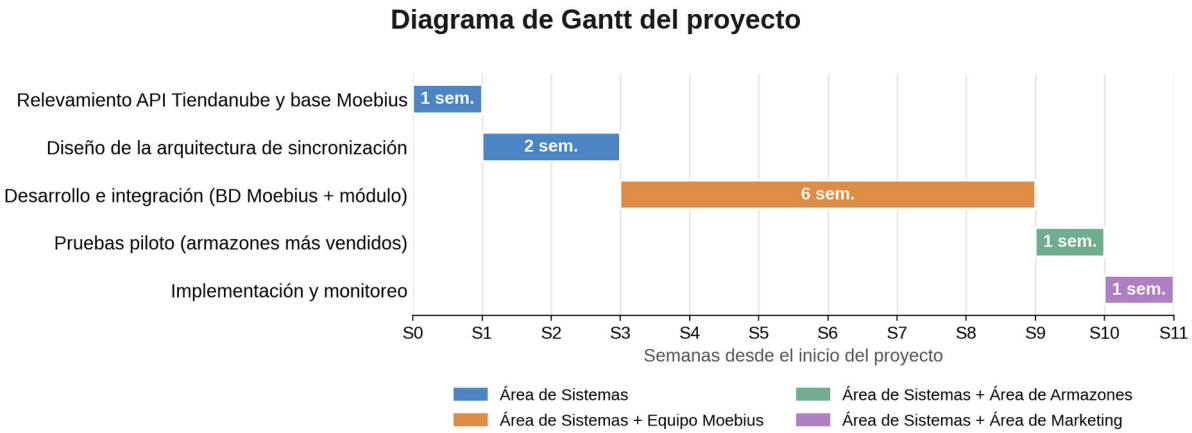

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para esta entrega utilicé un asistente de IA como apoyo para organizar la redacción y ordenar las ideas del análisis FODA, los objetivos y la planificación temporal, así como para generar los gráficos de la matriz FODA y el diagrama de Gantt a partir de la información que le proporcioné sobre el proyecto definido en la Entrega N°1 y sobre cómo se organiza realmente el trabajo entre mi área de Sistemas y el equipo de Moebius. El contenido conceptual y los datos del caso (qué tarea corresponde a cada área, cómo funciona la integración con Moebius, etc.) los revisé y corregí yo, para que la información fuera precisa.

Conclusión

El análisis FODA muestra que el proyecto de sincronización de stock es viable principalmente porque se apoya en una API que Tiendanube ya ofrece y porque cuenta con el respaldo del dueño tras la pérdida ya ocurrida, aunque su avance depende en parte de un actor externo (el equipo de Moebius), lo que exige una coordinación constante entre ambas partes. Los objetivos y metas definidos dan un marco concreto para medir si el módulo cumple su propósito, y la planificación temporal, repartida entre las áreas de Sistemas, Moebius, Armazones y Marketing, muestra que con una duración estimada de once semanas el proyecto puede completarse dentro de los plazos de la cátedra si se comienza a trabajar en los próximos días. Este diagnóstico y planificación sientan la base para las siguientes etapas del proyecto.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial: Unidad 4 - Herramientas de Administración (FODA y Diagrama de Gantt). Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.
